

# 工作联系单

工程名称: 水岸华府

编号: JLIS 2021-303

第 1 页, 共 1 页

## 联系内容

致: 都江堰天府置业有限公司

东莞市昊宇工程建设监理有限公司

事由: 关于二期园林施工与三期分界线确认事宜

关于二期园林施工与三期交接处的分界线确认事宜, 我司分别画出顶板, 负一层, 负二层的二三期分界线, 详见附图。分界线均已超出二期界限, 为满足二期交房后功能分区和消防验收要求, 需对二、三期之间地上及地下部分采取临时隔断措施, 隔断措施做法是否参照 2020 年 9 月 24 日 SAHF-140 号联系函施工。请贵方审核及确认其具体做法。

1. 地上部分分界线应满足消防验收要求, 消防扑救面区域不能小于二期总图(03)界线宽度。  
2. 隔墙材质及做法是否调整请工程中心明确

李伟 2021.8.24

施工单位(盖章)

现场代表: 陈杨

日期 2021 年 08 月 24 日

设计单位

监理单位

建设单位

水岸华府项目资料  
在满足消防验收的前提下同意按附图分界线实施。  
殷玉平



单位(盖章)

年 月 日

单位(盖章) 2021 年 8 月 25 日

单位(盖章) 2021 年 8 月 30 日

都江堰天府置业有限公司

Sichuan Tianfuzhiye Group Co. Ltd.

联系函


由：都江堰天府置业有限公司  
致：东莞市中泰建安工程有限公司  
日期：2020年9月24日  
档案号：2020924/SAHF-140  
事关：关于南峰水岸华府一、二期地下室分界临时隔断措施的联系函  
页数：第2页

---

为满足一期交房后功能分区和消防验收要求，现需对一、二期之间地下部分采取临时隔断措施，隔断措施做法如下：

临时隔断沿一、二期地下室分期线采用加气块砖砌筑隔墙（具体位置可根据施工需要适当调整，做法附后），相应工程量以三方现场确认为准。

签发：



2020年9月24日



广东南峰集团有限公司

Guangdong Nanfeng Group Co., Ltd.

[2020] 4号

联系函

由：都江堰天府置业有限公司

致：集团工程中心

日期：2020年07月14日

事 关：关于南峰水岸华府一二期分界临时隔断措施的联系函

页 数：共1页

1、由于南峰水岸华府分为三期施工，一期即将进入竣工验收阶段，二期项目正在主体结构施工。为满足一期交房后功能分区和消防验收要求，现需对一、二期之间地上部分和地下部分采取临时隔断措施。地下室部分，根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014》5.16条相关规定，当贴邻建造时，应采用防火墙隔开，防火墙耐火极限值应不低于2h。现请工程中心提供一、二期之间地上部分和地下部分临时隔断的具体做法。（附一、二期分界图）


2、二、三期情况与一、二期相同。（附二、三期分界图）

联系人：殷玉平 电话/邮箱：13631799100

回复：各分期根据当地验收要求设置临时隔断：

1. 地上部分：沿分期线（根据施工需要可适当调整）  
设置金属施工围挡，下部按覆土需要  
设置挡土墙，材料用多孔页岩砖，做法参考附件1B。

签发：




2. 地下室：沿分期线砌筑200mm厚蒸压加气块防火墙。

2020年7月14日

仅验收一侧刮腻子三道（需保证墙面平整）。

墙体砌筑和拆除应做好成品保护措施。

刘美  
2020.9.25


  
2020.9.25







同音 殷玉平 2021.8.30

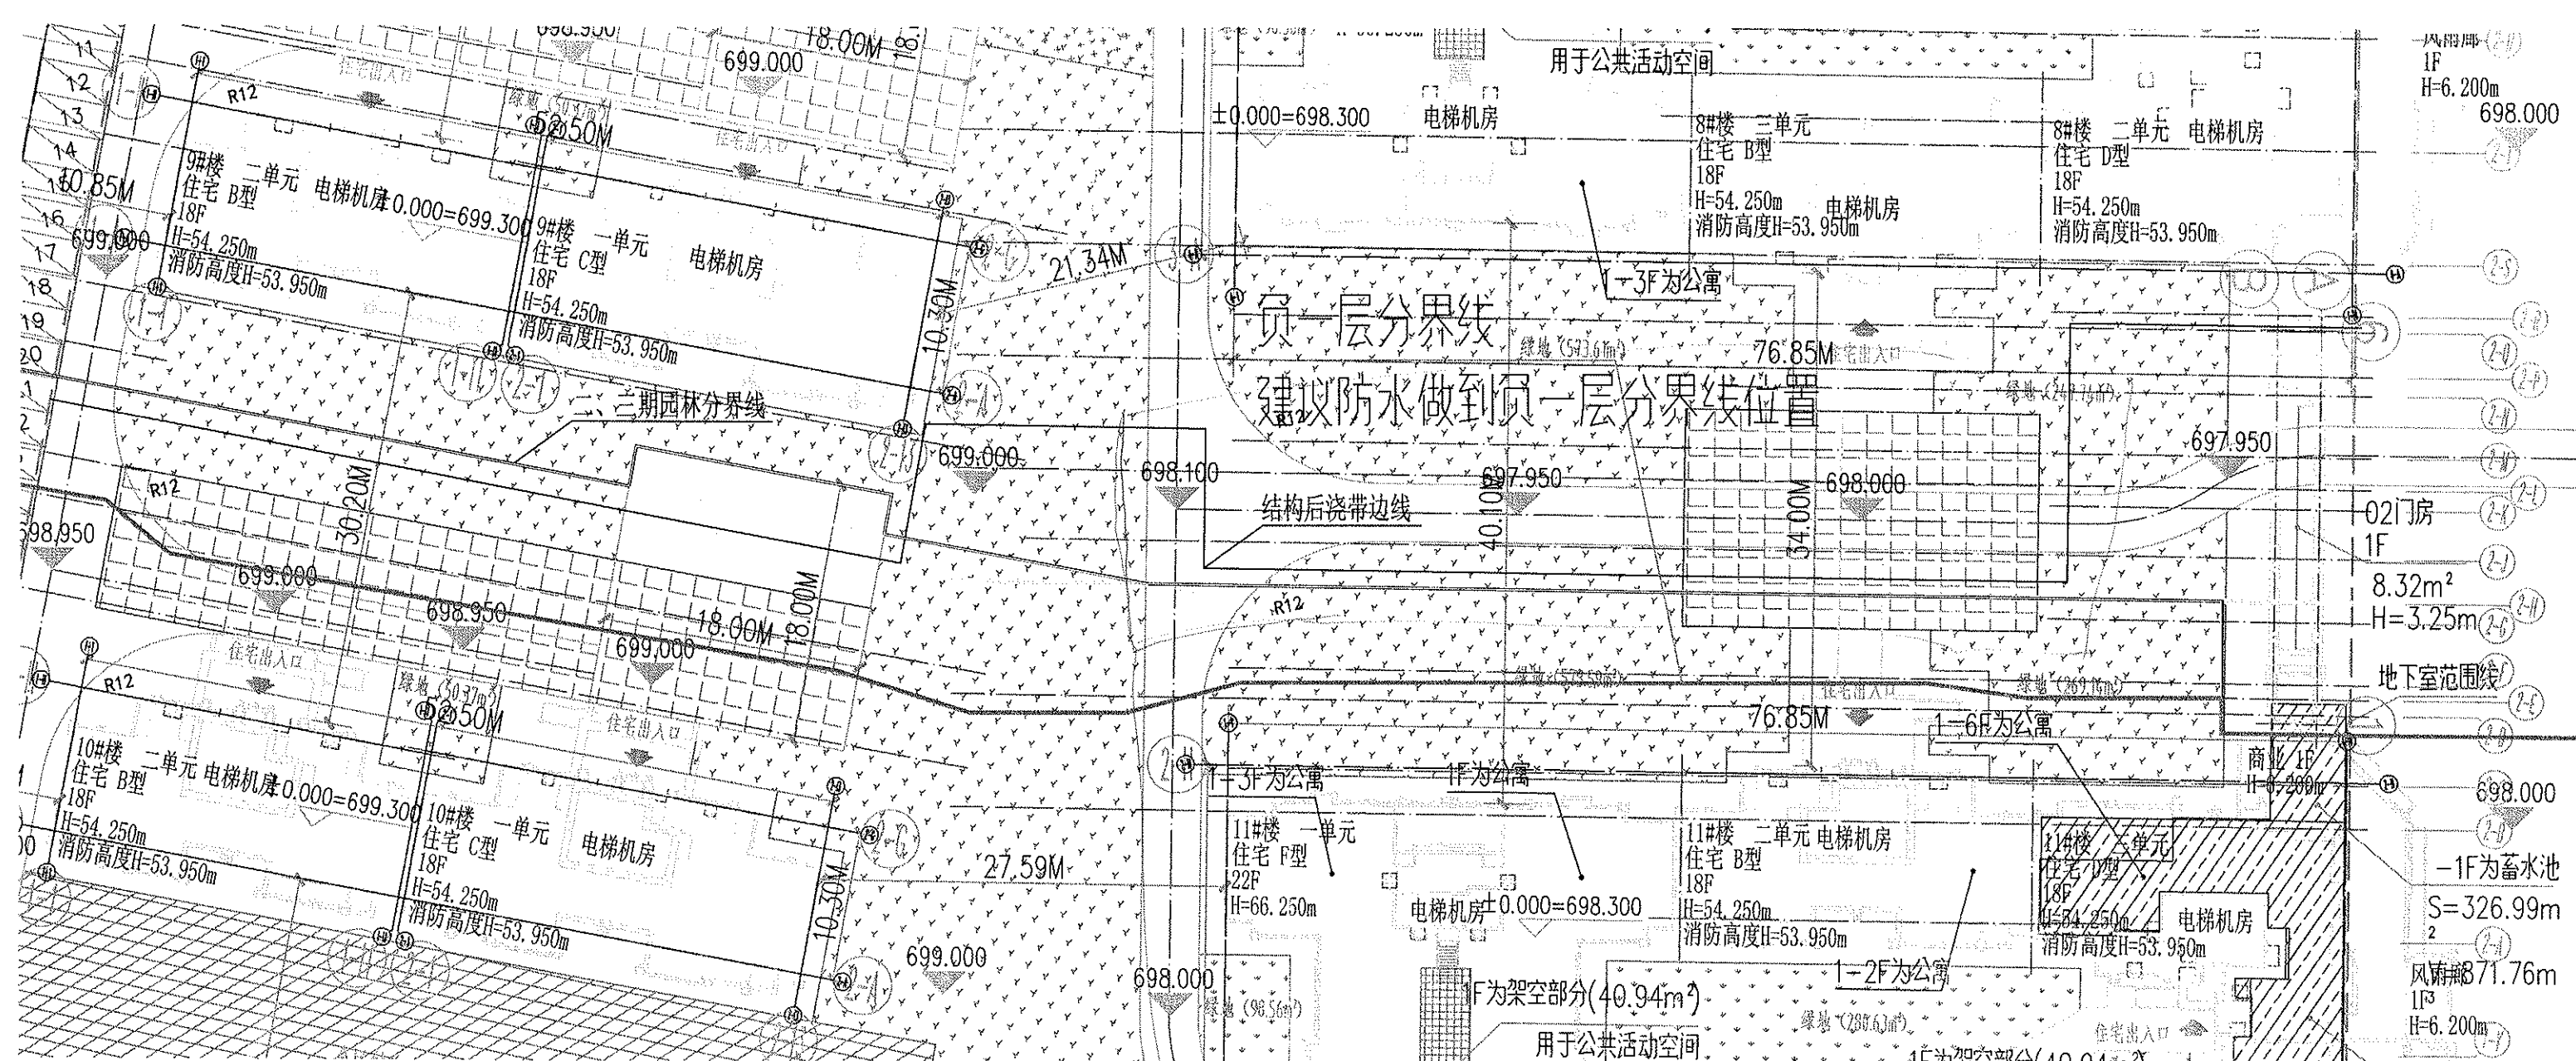

此区域的景观应综合考虑  
符居民要求,主大门入口通道景观

满足外立面与前期工程衔接以图分界  
及管理部门验收 彭江

2021.8.28
